


恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
1	113/10/01~113/10/31	結構工程	1. 4F 頂版工地現場 2. 4F 頂版雜工雜物清理



2	113/10/01~113/10/31	結構工程	1. 4F 頂版 RC 澆築整體粉光機具組裝 2. 4F 頂版 RC 澆築完成面
---	---------------------	------	---

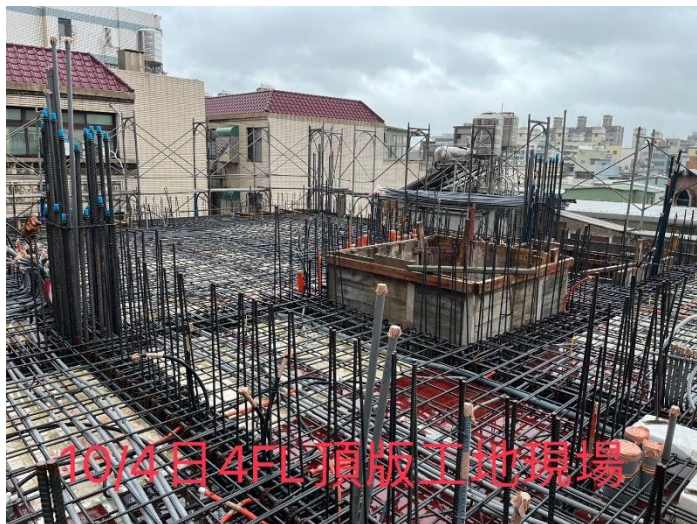

恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
3	113/10/01~113/10/31	結構工程	1. 4F 頂版整體粉光施工 2. 5F 放樣完成



4	113/10/01~113/10/31	結構工程	1. 5F 鋼筋工柱牆筋吊料 2. 5F 水電管線整理
---	---------------------	------	--------------------------------



恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
5	113/10/01~113/10/31	結構工程	1. 5F 鷹架完成 2. 5F 模板整理




6	113/10/01~113/10/31	結構工程	1. 5F 柱筋續接 2. 5F 模板柱牆模組立
---	---------------------	------	-----------------------------




恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
7	113/10/01~113/10/31	結構工程	1. 5F 牆面單面模組立 2. 5F 水電牆面放樣及接線盒

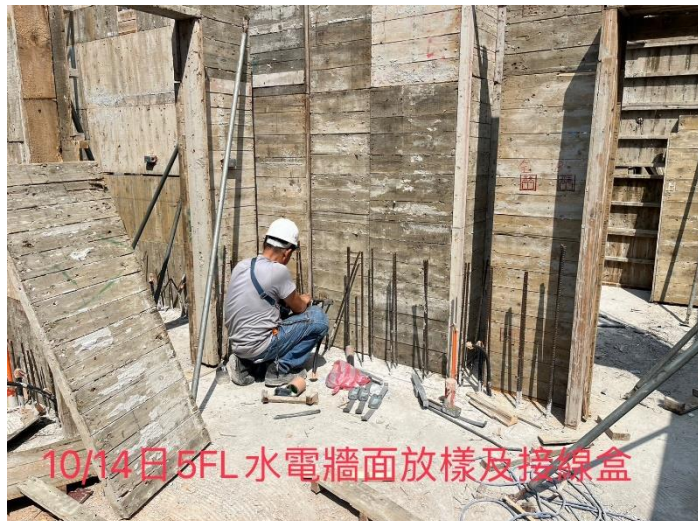


8	113/10/01~113/10/31	結構工程	1. 5F 牆面鋼筋綁紮 2. 5F 水電牆面配管
---	---------------------	------	------------------------------

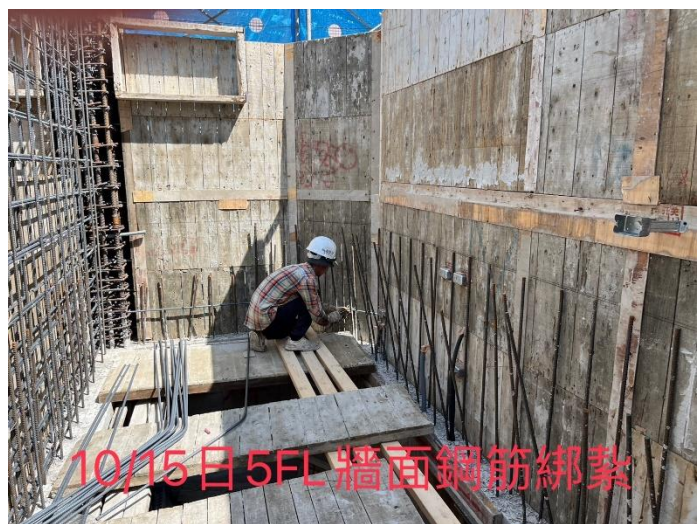

恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
9	113/10/01~113/10/31	結構工程	1. 5F 模板樓梯封模 2. 5F 模板柱牆封模

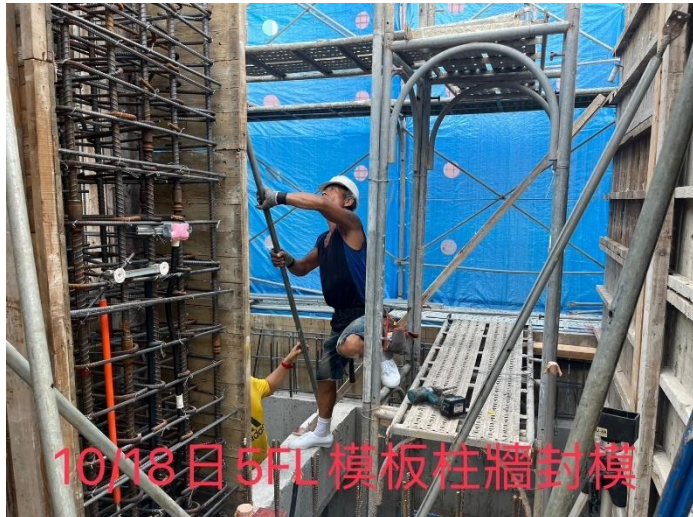

10	113/10/01~113/10/31	結構工程	1. 5F 模板梁底組立 2. 5F 模板牆面組模固定
----	---------------------	------	--------------------------------




恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
11	113/10/01~113/10/31	結構工程	1. 5F 模板牆面固定 2. 5F 頂版梁底模板組立



12	113/10/01~113/10/31	結構工程	1. 5F 頂版模板組立 2. 5F 頂版模板支撐架鋪
----	---------------------	------	--------------------------------

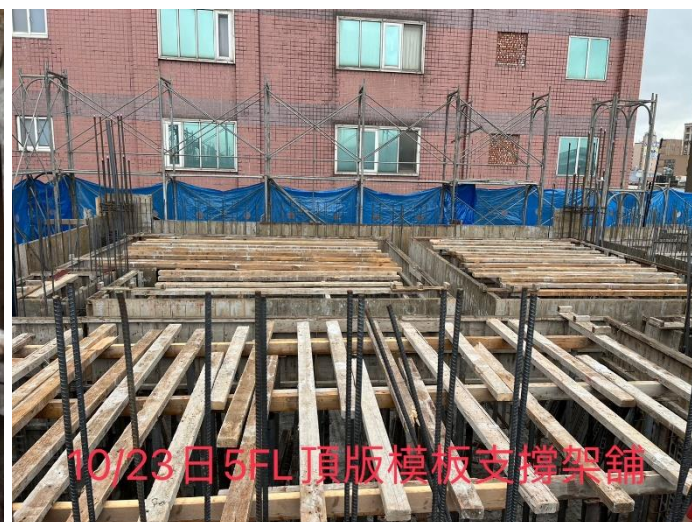

恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
13	113/10/01~113/10/31	結構工程	1. 5F 頂版模板架鋪 2. 5F 頂版水電放樣




14	113/10/01~113/10/31	結構工程	1. 5F 頂版模板架鋪 2. 5F 頂版梁筋綁紮
----	---------------------	------	------------------------------



恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
15	113/10/01~113/10/31	結構工程	1. 5F 頂版模板固定加強 2. 5F 頂版鋼筋下層筋綁紮

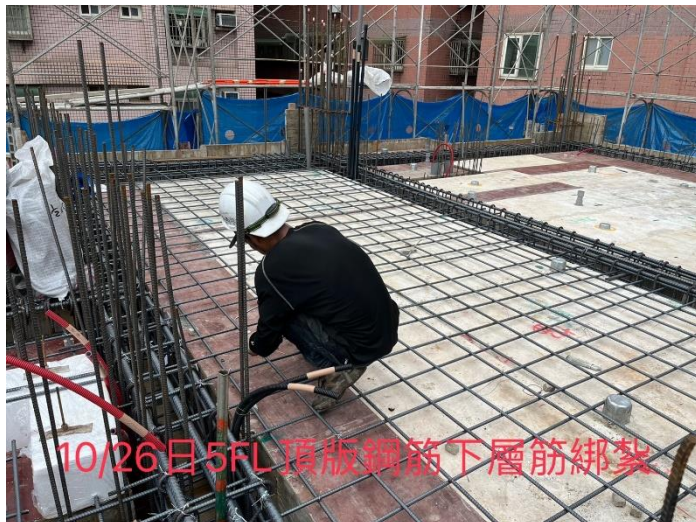

16	113/10/01~113/10/31	結構工程	1. 5F 頂版水電配管 2. 5F 頂版上層筋綁紮
----	---------------------	------	-------------------------------



恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
17	113/10/01~113/10/31	結構工程	1. 5F 頂版高程及預留筋放樣 2. 5F 樓梯鋼筋綁紮



18	113/10/01~113/10/31	結構工程	1. 5F 頂版鋼筋收尾加強 2. 5F 頂版水電配管
----	---------------------	------	--------------------------------



No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
19	113/10/01~113/10/31	結構工程	1. 颱風來襲鷹架帆布整理

