

恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
1	113/11/01~113/11/30	結構工程	1. 5F 頂版 RC 澆灌 2. 5F 樓梯 RC 整平




2	113/11/01~113/11/30	結構工程	1. 5F 頂版 RC 澆灌整體粉光 2. 3F 欄杆及花台 RC 澆灌
---	---------------------	------	---



恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
3	113/11/01~113/11/30	結構工程	1. 6F 單面模板組立 2. 6F 模板柱牆膜組立

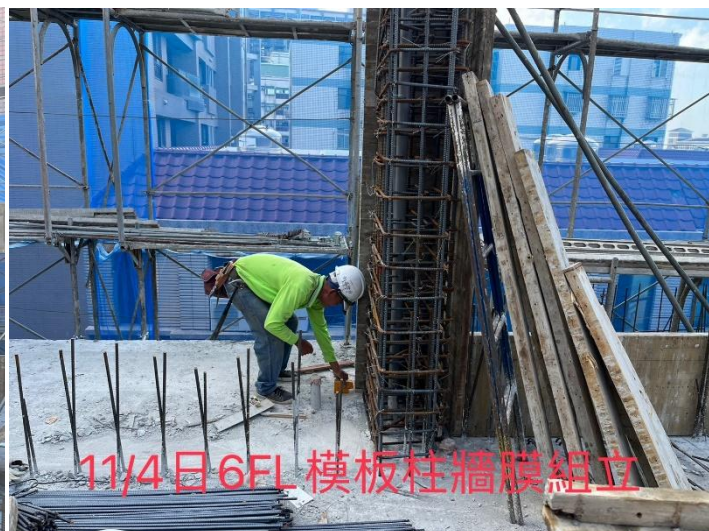


4	113/11/01~113/11/30	結構工程	1. 6F 水電牆面放樣配管 2. 6F 模板單面模組立
---	---------------------	------	---------------------------------



No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
5	113/11/01~113/11/30	結構工程	1. 6F 鋼筋牆筋綁紮 2. 6F 牆面水電箱體定位



6	113/11/01~113/11/30	結構工程	1. 6F 水電牆面配管 2. 6F 模板牆面封模
---	---------------------	------	------------------------------

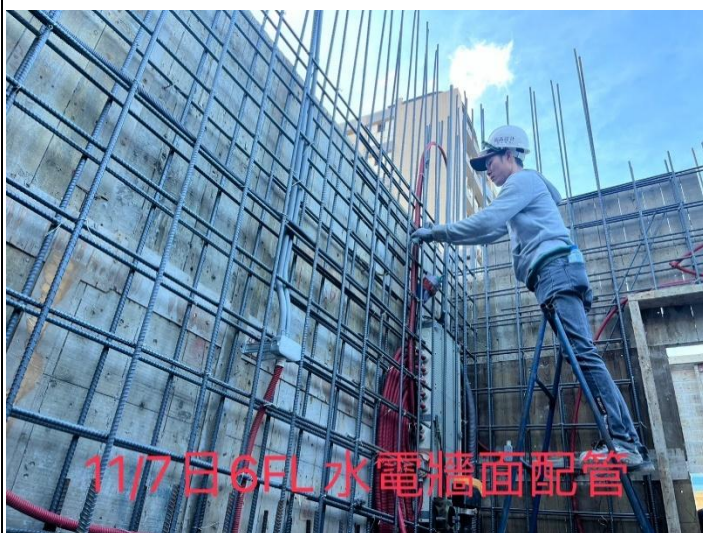

恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
7	113/11/01~113/11/30	結構工程	1. 6F 模板牆面固定 2. 6F 水電牆面配管



8	113/11/01~113/11/30	結構工程	1. 6F 模板樓梯施工 2. 6F 頂版模板梁底架鋪
---	---------------------	------	--------------------------------



No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
9	113/11/01~113/11/30	結構工程	1. 6F 頂版梁側架鋪 2. 6F 頂版模板梁牆組立




10	113/11/01~113/11/30	結構工程	1. 6F 頂版模板架鋪 2. 6F 頂版模板梁底固定加強
----	---------------------	------	----------------------------------




恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
11	113/11/01~113/11/30	結構工程	1. 6F 頂版水電放置穿梁套管 2. 6F 頂版水電放樣完成

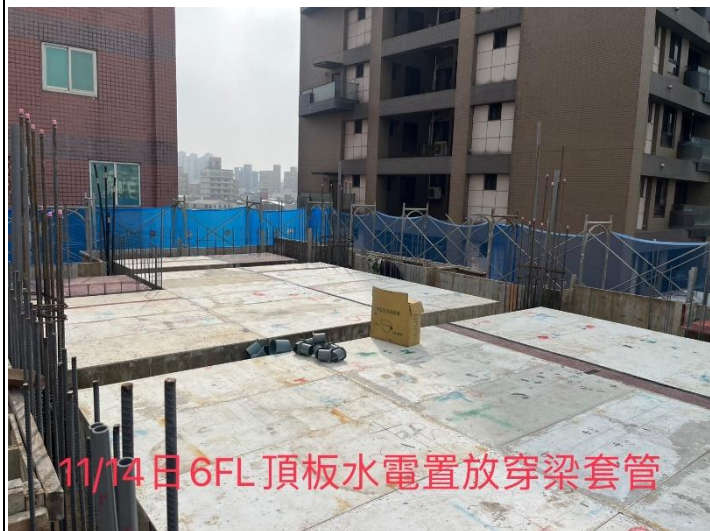


12	113/11/01~113/11/30	結構工程	1. 6F 頂版梁鋼筋綁紮 2. 6F 頂版水電配管
----	---------------------	------	-------------------------------

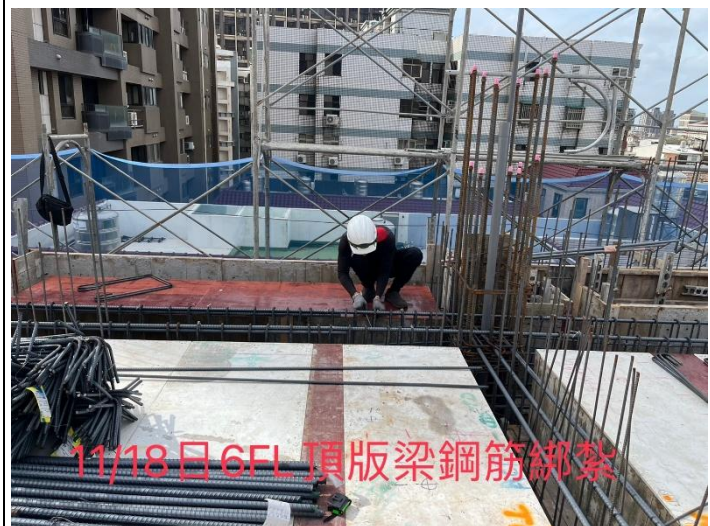

恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
13	113/11/01~113/11/30	結構工程	1. 6F 頂版模板梁位固定加強 2. 6F 頂版下層筋鋼筋綁紮

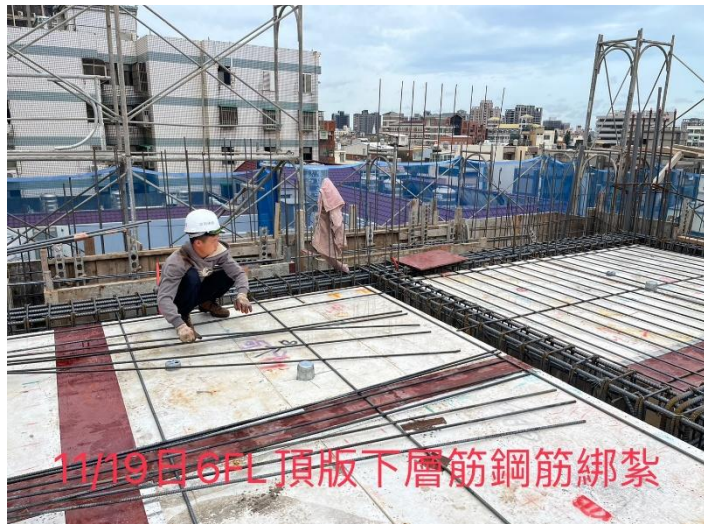

14	113/11/01~113/11/30	結構工程	1. 6F 頂版水電穿梁套管配置 2. 6F 頂版鋼筋上層筋綁紮
----	---------------------	------	-------------------------------------




恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
15	113/11/01~113/11/30	結構工程	1. 6F 頂版鷹架放置固定件 2. 6F 頂版水電配管校對



16	113/11/01~113/11/30	結構工程	1. 6F 頂版水電水管壓力測試 2. 6F 頂板水電完成現場
----	---------------------	------	------------------------------------

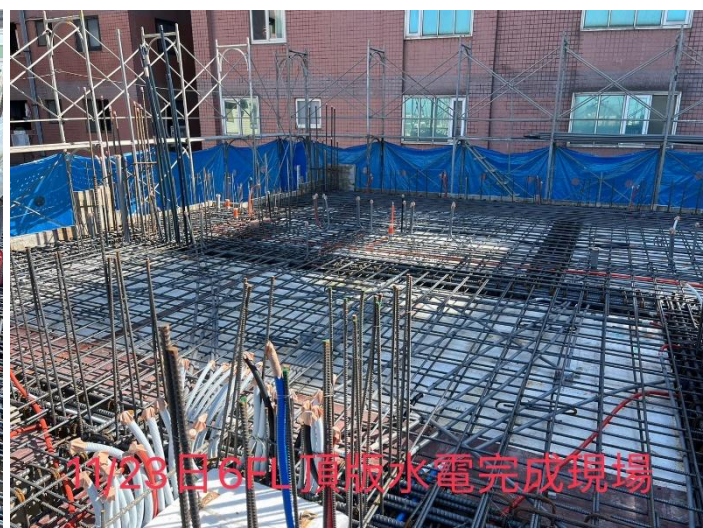

恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
17	113/11/01~113/11/30	結構工程	1. 6F 頂板整平標高器施作完成 2. 6F 頂板建築師查驗




18	113/11/01~113/11/30	結構工程	1. 6F 頂板技師查驗 2. 6F 頂板 RC 澆灌振動棒施作
----	---------------------	------	-------------------------------------



No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
19	113/11/01~113/11/30	結構工程	1. 6F 頂板 RC 澆灌整平作業 2. 7F 鋼筋柱筋續接



20	113/11/01~113/11/30	結構工程	1. 7F 模板備料整理 2. 7F 模板單面牆組立
----	---------------------	------	-------------------------------

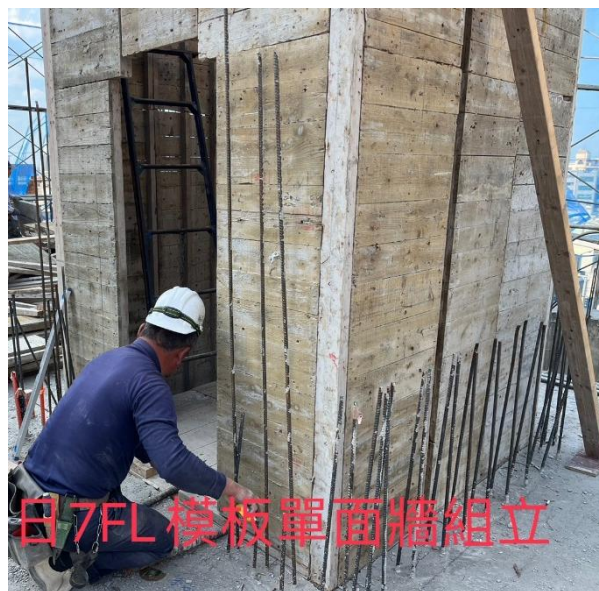

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
21	113/11/01~113/11/30	結構工程	1. 7F 模板柱位側模組立 2. 7F 模板單面模組立

