


恂品里山


No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
1	114/03/01~114/03/31	結構工程	1. PR2FL 頂版柱筋綁紮 2. PR2FL 樓梯間模板拆模



2	114/03/01~114/03/31	結構工程	1. PR3FL 外牆單面模組立 2. PR3FL 模板外牆單面模組立
---	---------------------	------	--

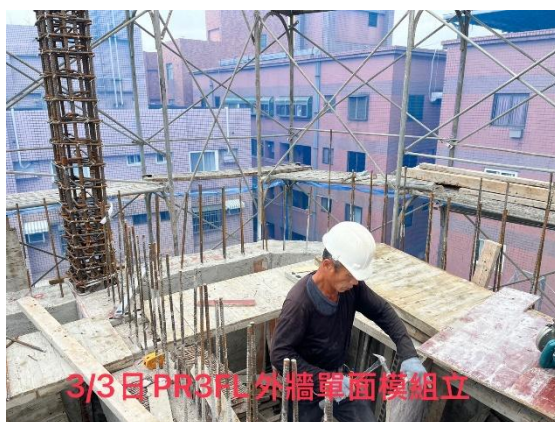


忸品里山

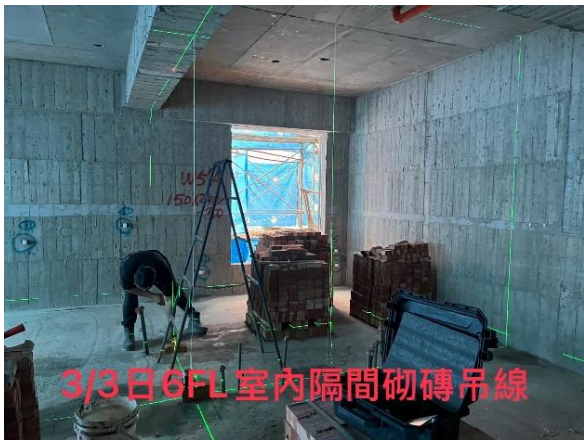No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
3	114/03/01~114/03/31	結構工程	1. PR2FL 模板單面模組立 2. 2F 泥作放樣吊線
 3/3日PR2FL 模板單面模組立  3/3 2F 泥作放樣吊線			
4	114/03/01~114/03/31	結構工程	1. 6F 室內隔間砌磚吊線 2. 水電室內配管
 3/3日6FL 室內隔間砌磚吊線  3/4日水電室內配管			

恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
5	114/03/01~114/03/31	結構工程	1. 2F 水電室內配管 2. 6F 室內隔間砌磚
 3/5日2FL水電室內配管  3/6日6FL室內隔間砌磚			
6	114/03/01~114/03/31	結構工程	1. 水電室內隔間配管 2. PR3FL 模板外牆組模
 3/6日水電室內隔間配管  3/7日PR3FL模板外牆組模			

恂品里山

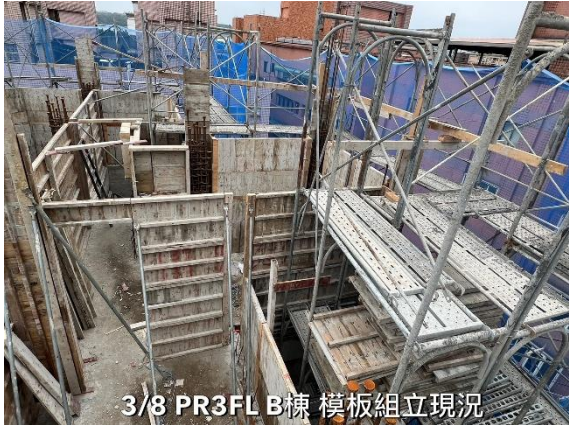No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
7	114/03/01~114/03/31	結構工程	1. PR3FL A 棟 模板組立現況 2. PR3FL B 棟 模板組立現況
 			
8	114/03/01~114/03/31	結構工程	1. A2-6F 室內隔間砌磚現況 2. PR3FL 水電牆面配管
 			

恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
9	114/03/01~114/03/31	結構工程	1. PR3FL 鋼筋牆面綁紮 2. A2-3F 冷氣套管施工
 3/10日 PR3FL 鋼筋牆面綁紮  3/10 3F-A2 冷氣套管施工			
10	114/03/01~114/03/31	結構工程	1. A2-6F 室內隔間砌磚 2. PR3FL 電梯機房水電配管
 3/11日 6FLA2 室內隔間砌磚  3/11日 PR3FL 電梯機房水電配管			

忸品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
11	114/03/01~114/03/31	結構工程	1. 泥作外牆放樣灰誌施工 2. 泥作外牆放樣灰誌及線條
 			
12	114/03/01~114/03/31	結構工程	1. PR3FL 模板牆面封模 2. 4F 水電隔間配管
 			

恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
13	114/03/01~114/03/31	結構工程	1. 泥作室內隔間灰誌及線條施工 2. 5F 水電室內隔間配管




14	114/03/01~114/03/31	結構工程	1. PR3FL 模板牆面封模 2. PR3FL 模板牆面封模固定
----	---------------------	------	--------------------------------------




恂品里山


No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
15	114/03/01~114/03/31	結構工程	1. 水電管道間配管 2. 泥作外牆灰誌及線條施工

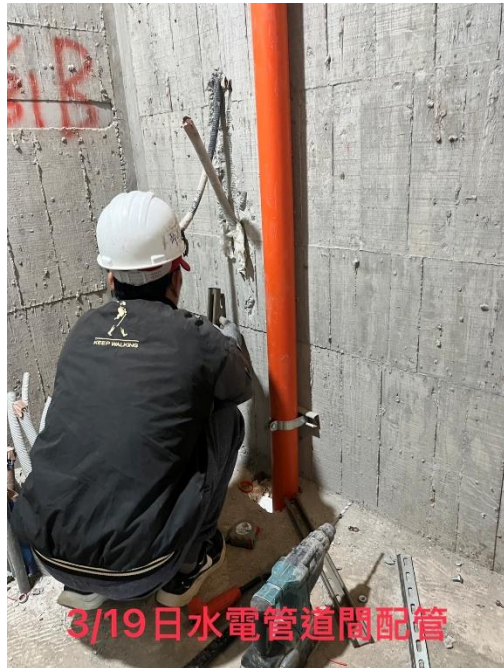

16	114/03/01~114/03/31	結構工程	1. PR3FL 頂版模板梁底及側模組立 2. PR3FL 頂版模板架鋪
----	---------------------	------	---

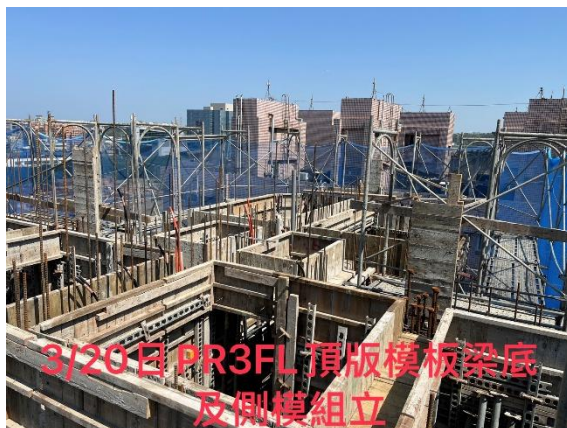

恂品里山

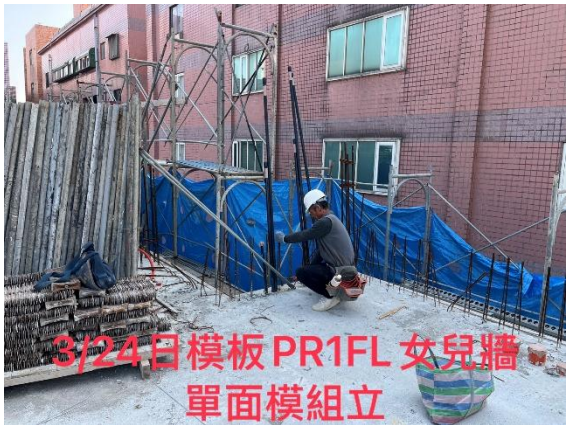No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
17	114/03/01~114/03/31	結構工程	1. PR3FL 頂版模板梁外模固定 2. PR3FL 頂版梁鋼筋綁紮
 			
18	114/03/01~114/03/31	結構工程	1. 模板 PR1FL 女兒牆單面模組立 2. PR3FL 頂版水電配管
 			

恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
19	114/03/01~114/03/31	結構工程	1. PR3FL 頂版標高施作 2. PR3FL 頂版 RC 澆灌模板顧模
 			
20	114/03/01~114/03/31	結構工程	1. PR3FL RC 澆灌振動棒施工 2. PR3FL 頂版 RC 澆灌後現場
 			

忞品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
21	114/03/01~114/03/31	結構工程	1. PR3FL 頂版泥作粉光 2. PR3FL 頂版灑水養護
 			
22	114/03/01~114/03/31	結構工程	1. PR3FL 頂版模板拆除側模 2. PR1FL 女兒牆鋼筋綁紮
 			

忸品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
23	114/03/01~114/03/31	結構工程	1. PR1FL 女兒牆水電配管 2. PR1FL 模板女兒牆封模
3/28日PR1FL女兒牆水電配管 3/29日PR1FL模板女兒牆封模			
24	114/03/01~114/03/31	結構工程	1. 3F 泥作灰誌及線條施作 2. 7L 水電管線巡查
3/29日3FL泥作灰誌及線條施作 3/31日7FL水電管線巡查			

忸品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
25	114/03/01~114/03/31	結構工程	1. 5F 泥作灰誌及線條施作 2. PR1FL 鷹架架鋪

