

恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
1	113/12/01~113/12/31	結構工程	1. 7F 水電牆面配管 2. 7F 牆面鋼筋綁紮




2	113/12/01~113/12/31	結構工程	1. 7F 模板牆面封模 2. 7F 模板牆面固定
---	---------------------	------	------------------------------



恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
3	113/12/01~113/12/31	結構工程	1. 7F 模板牆面置放螺桿 2. 7F 頂版模板梁底架鋪

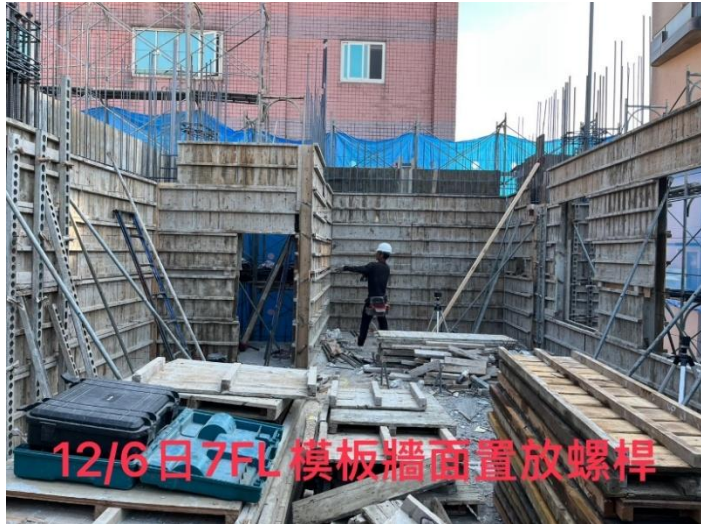

4	113/12/01~113/12/31	結構工程	1. 7F 頂版模板梁側組模 2. 7F 頂版模板梁底組立
---	---------------------	------	----------------------------------




恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
5	113/12/01~113/12/31	結構工程	1. 7F 頂版模板架鋪 2. 7F 頂版模板架鋪平板





6	113/12/01~113/12/31	結構工程	1. 7F 頂版水電版面放樣 2. 7F 頂版雜工雜物清理
---	---------------------	------	----------------------------------

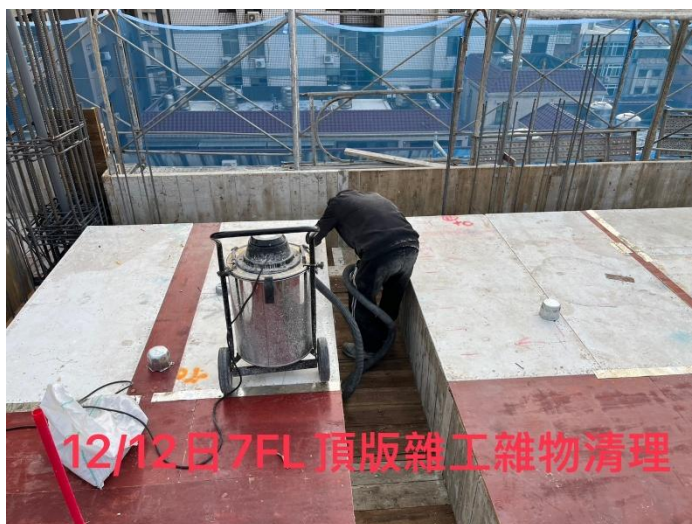


No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
7	113/12/01~113/12/31	結構工程	1. 7F 頂版鋼筋梁筋綁紮 2. 7F 頂版水電配管



8	113/12/01~113/12/31	結構工程	1. 7F 鋼筋樓梯綁紮 2. 7F 頂版鋼筋上層筋綁紮
---	---------------------	------	---------------------------------

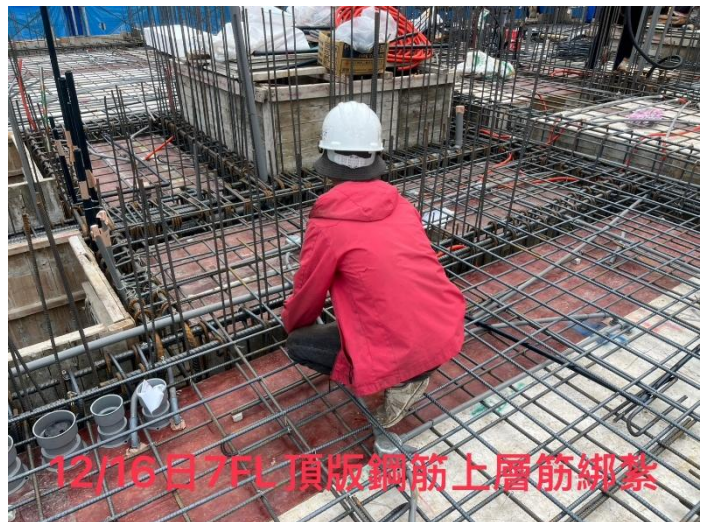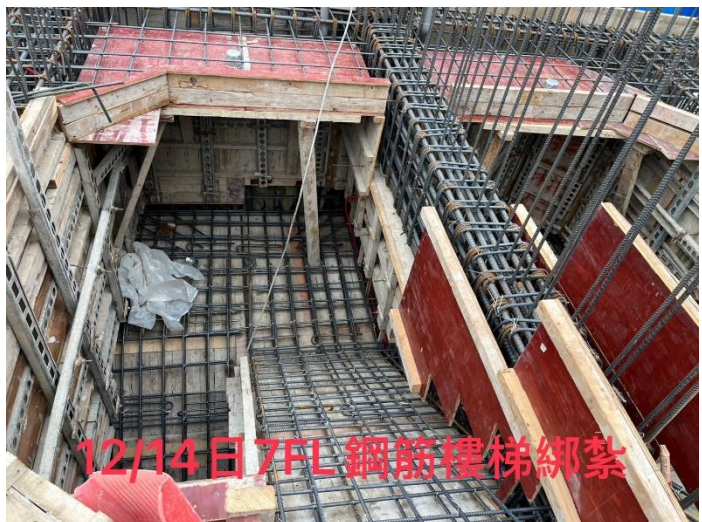

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
9	113/12/01~113/12/31	結構工程	1. 7F 頂版預留筋綁紮 2. 7F 頂版鋼筋上層筋綁紮

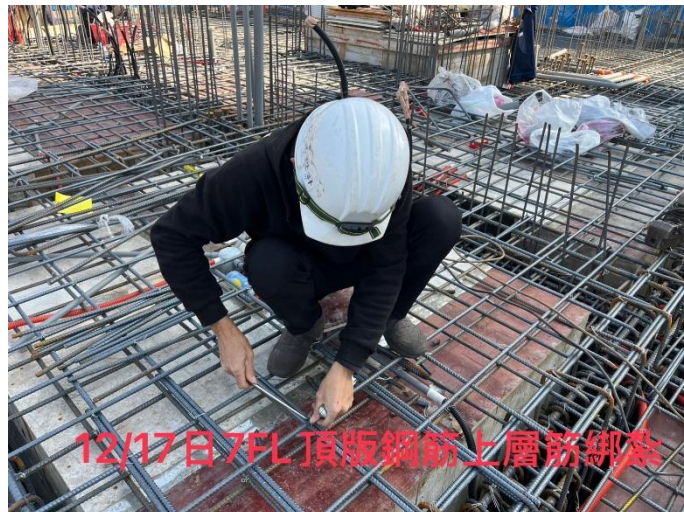

10	113/12/01~113/12/31	結構工程	1. 7F 頂版模板收尾 2. 7F 頂版技師查驗
----	---------------------	------	------------------------------



恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
11	113/12/01~113/12/31	結構工程	1. 7F 頂版 RC 澆灌 2. 7F 頂版 RC 澆灌整平




12	113/12/01~113/12/31	結構工程	1. PRFL 鋼筋吊料 2. PR1FL 模板單面模組立
----	---------------------	------	----------------------------------



恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
13	113/12/01~113/12/31	結構工程	1. PR1FL 水電配管 2. PR1FL 鋼筋柱筋綁紮

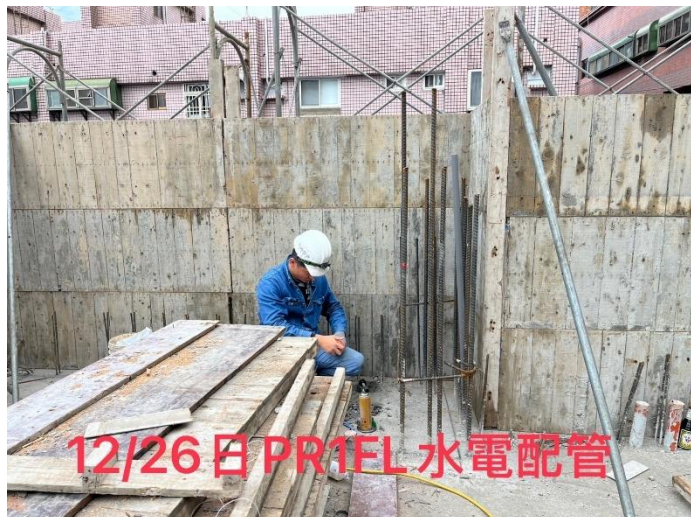

14	113/12/01~113/12/31	結構工程	1. PR1FL 模板女兒牆單面模組立 2. 2F 室內砌磚隔間
----	---------------------	------	-------------------------------------



No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
15	113/12/01~113/12/31	結構工程	1. PR1FL 模板組立 2. 2F 室內隔間砌磚



16	113/12/01~113/12/31	結構工程	1. PR1FL 模板牆面封模 2. PR1FL 模板樓梯封模
----	---------------------	------	------------------------------------

