








恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
1	114/10/01~114/10/31	建築外牆 放樣貼磚	1. 屋突層外牆磁磚施工 2. 屋突層外牆磁磚施工
<div>   </div>			
2	114/10/01~114/10/31	建築外牆 放樣貼磚	1. 樓層外牆磁磚放樣 2. 樓層外牆磁磚施工
<div>   </div>			

忸品里山

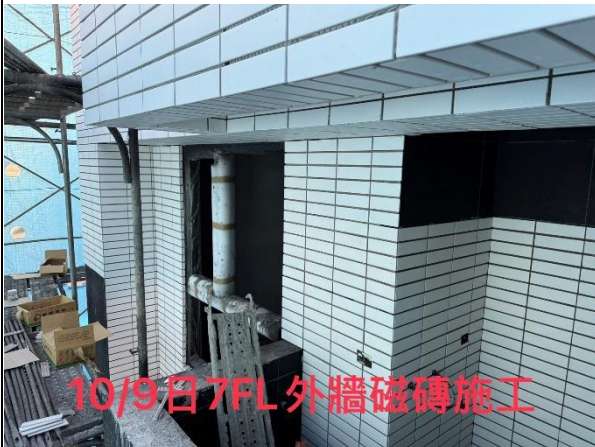
No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
3	114/10/01~114/10/31	建築外牆 放樣貼磚	1. 7F 外牆磁磚放樣 2. 屋突層泥作塗料部分面層粉刷
<div>   </div> <div> <p>10/4日7FL 外牆磁磚放樣</p> <p>10/6日泥作屋突層塗料部分面層粉刷</p> </div>			
4	114/10/01~114/10/31	建築外牆 放樣貼磚	1. 屋突層外牆磁磚抹縫 2. 6F 外牆磁磚放樣
<div>   </div> <div> <p>10/7日屋突層外牆磁磚抹縫</p> <p>10/8日6FL 外牆磁磚放樣</p> </div>			

恂品里山





No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
5	114/10/01~114/10/31	建築外牆 放樣貼磚	1. PR1FL 女兒牆外牆磁磚施工 2. 7F 外牆磁磚施工







6	114/10/01~114/10/31	建築外牆 放樣貼磚	1. 7F 外牆磁磚施工 2. 外牆磁磚施工
---	---------------------	--------------	---------------------------



恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
7	114/10/01~114/10/31	建築外牆 放樣貼磚	1. 5F 外牆磁磚放樣 2. 6F 外牆磁磚施工
<div>   </div>			
8	114/10/01~114/10/31	建築外牆 放樣貼磚 室內工程	1. 5F 外牆磁磚施工 2. B1FL 水電吊管施工
<div>   </div>			

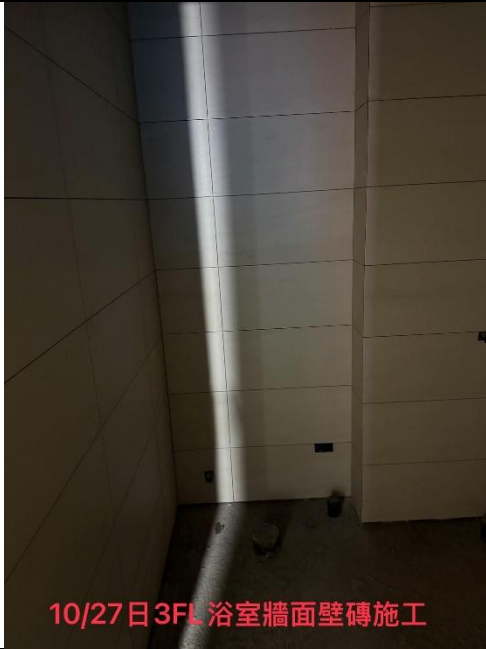

恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
9	114/10/01~114/10/31	建築外牆 放樣貼磚	1. 5F 外牆磁磚施工 2. 4F 外牆磁磚施工
<div>  <p>10/15日5FL外牆磁磚施工</p>  <p>10/16日4FL外牆磁磚施工</p> </div>			
10	114/10/01~114/10/31	建築外牆 放樣貼磚	1. 4F 外牆磁磚施工 2. 屋突層清水模施工
<div>  <p>10/17日4FL外牆磁磚施工</p>  <p>10/17日屋突層清水模施工</p> </div>			

忸品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
11	114/10/01~114/10/31	建築外牆 放樣貼磚	1. 屋突層清水模放樣 2. 屋突層清水模塗料造型放樣
<div>  <p>10/18日屋突層清水模放樣</p>  <p>10/20日屋突層清水模塗料造型放樣</p> </div>			
12	114/10/01~114/10/31	室內工程	1. 7F 油漆天花板批土 2. B2-2F 浴室牆面磁磚施工
<div>  <p>10/22日7FL 油漆天花板批土</p>  <p>10/23日2FL B2 浴室牆面磁磚施工</p> </div>			

忞品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
13	114/10/01~114/10/31	室內工程	1. A1-2F 浴室牆面磁磚施工 2. 3F 浴室牆面磁磚施工
<div>  <p>10/23日2FL A1浴室牆面磁磚施工</p>  <p>10/27日3FL 浴室牆面壁磚施工</p> </div>			
14	114/10/01~114/10/31	室內室外工程	1. 外牆樓層磁磚抹縫 2. 6F 天花板油漆批土
<div>  <p>10/27日外牆樓層磁磚抹縫</p>  <p>10/27日6FL 油漆天花板批土</p> </div>			

恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
15	114/10/01~114/10/31	室內室外工程	1. 屋突層清水摸施工 2. 4F 浴室牆面磁磚施工
<div>   </div> <div> <p>10/27日屋突層清水摸施工</p> <p>10/29日4FL浴室牆面磁磚施工</p> </div>			
16	114/10/01~114/10/31	室內工程	1. 5F 牆面及天花板油漆批土 2. 4F 浴室牆面磁磚施工
<div>   </div> <div> <p>10/29日5FL油漆牆面及天花板批土</p> <p>10/29日4FL浴室牆面磁磚施工</p> </div>			

忸品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
17	114/10/01~114/10/31	室內室外工程	1. 樓層外牆清水摸批土 2. PR3FL 油漆批土
<div>  <p>10/30日外牆樓層清水摸批土</p>  <p>10/30日PR3FL油漆批土</p> </div>			
18	114/10/01~114/10/31	室內室外工程	1. 外牆清水摸批土施工 2. 5F 浴室牆面磁磚施工
<div>  <p>10/30日外牆清水摸批土施工</p>  <p>10/31日5FL浴室牆面磁磚施工</p> </div>			

恂品里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
19	114/10/01~114/10/31	室內工程	1. B1FL 電表箱定位 2. 5F 浴室牆面磁磚施工

