

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
1	115/01/01~115/01/31	結構工程	1. 樓層浴室天花板施工 2. 樓層電梯牆面壁磚施工



1/2日樓層浴室天花板施工



1/2日樓層電梯牆面壁磚施工

2	115/01/01~115/01/31	結構工程	1. 屋突層水電給水管施工 2. 樓層陽台防水測試
---	---------------------	------	------------------------------



1/2日屋突層水電給水管施工



1/3日樓層陽台防水測試

恂品-里山


No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
3	115/01/01~115/01/31	結構工程	1. 樓層陽台地磚施工 2. 1F 周邊水溝鋼筋綁紮



4	115/01/01~115/01/31	結構工程	1. PR1FL 水電給水鋼管施工 2. 1F 水溝陰井埋設
---	---------------------	------	-----------------------------------



No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
5	115/01/01~115/01/31	結構工程	1. 水電配合埋設污水管路 2. 樓梯牆面泥作灰誌施工

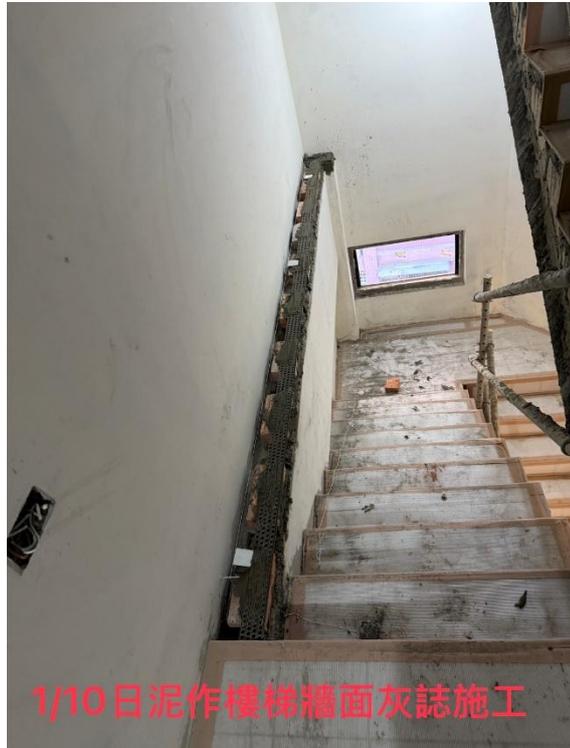

6	115/01/01~115/01/31	結構工程	1. 樓層陽台地磚施工 2. 樓層木工天花板施工
---	---------------------	------	-----------------------------



No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
7	115/01/01~115/01/31	結構工程	1. 1F 周邊水溝底 RC 澆築完成 2. 2F 電梯牆面磁磚施工



8	115/01/01~115/01/31	結構工程	1. 1F 水溝牆模施工 2. PR1FL 雜工雜物清理
---	---------------------	------	---------------------------------



恂品-里山

No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
9	115/01/01~115/01/31	結構工程	1. 1F 牆面泥作粉刷打底 2. 屋突水電預留管施工



10	115/01/01~115/01/31	結構工程	1. 地下室水電管路施工 2. 1F 牆面泥作粉刷打底
----	---------------------	------	--------------------------------



No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
11	115/01/01~115/01/31	結構工程	1. 1F 水溝周邊施工 2. 1F 水溝周邊施工



12	115/01/01~115/01/31	結構工程	1. B1FL 水電管路安裝 2. PR1FL 自來水管施工
----	---------------------	------	-----------------------------------



No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
13	115/01/01~115/01/31	結構工程	1. 室內泥作地坪粉刷 2. 1F 水電吊管施工



14	115/01/01~115/01/31	結構工程	1. 1F 水電吊管施工 2. 1F 周邊地坪鋼筋綁紮
----	---------------------	------	--------------------------------





No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
15	115/01/01~115/01/31	結構工程	1. 1F 隔間砌磚 2. 樓層天花板油漆批土



16	115/01/01~115/01/31	結構工程	1. 樓層天花板油漆批土 2. 屋突給水管安裝施工
----	---------------------	------	------------------------------



No	日期	工程項目	施工位置及內容說明
17	115/01/01~115/01/31	結構工程	1. 1F 水電吊管施工 2. 消防總機線路檢測

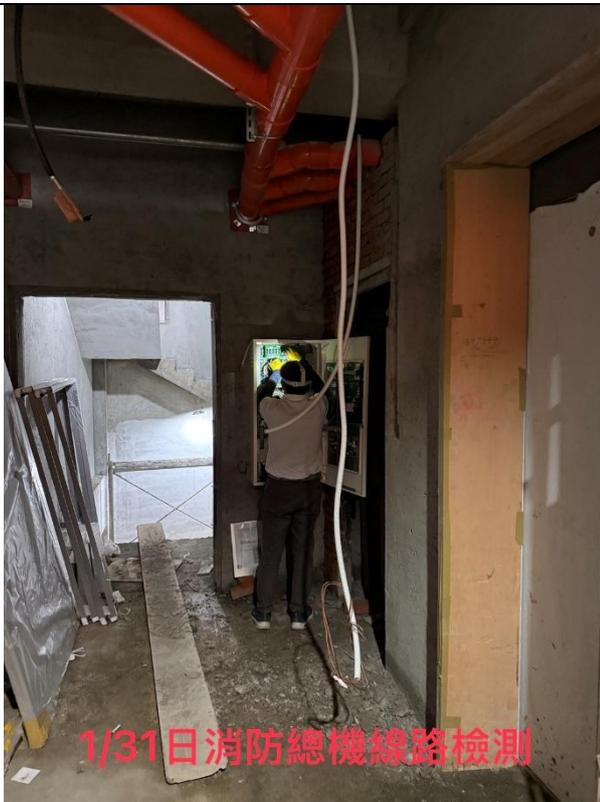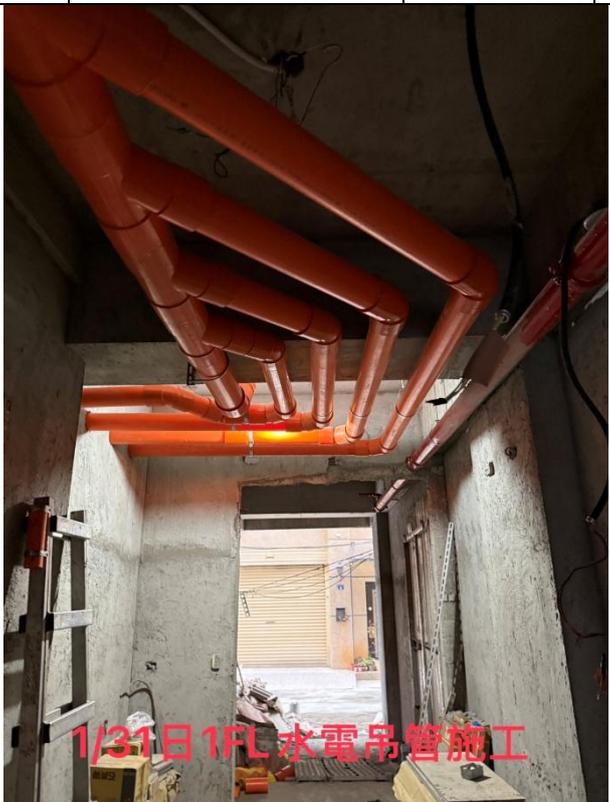

18	115/01/01~115/01/31	結構工程	1. 1F 周邊鋪面及水溝蓋 RC 澆灌 2. 1F 周邊鋪面及水溝蓋 RC 澆灌
----	---------------------	------	--

